

«Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցեր» ՓԲԸ
2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՎ

ԵՐԵՎԱՆ 2006

ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Սույն վերլուծական տեղեկանքը կազմվել է ի կարարումն Նայաստանի Նանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի փարեկան աշխատանքային ծրագրի 17-րդ կետի՝ «Նայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2005 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքների գնահատման նպատակով՝ Նայաստանի Նանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմի ղեկավարի 13.04.2006թ. № 045-ԱՂ հրամանի համաձայն ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից:

Աշխատանքային խմբի կազմում ներգրավվել են՝

Աշխատանքային խմբի ղեկավար՝

Աբգար Բուդադյան - Ներդրումային ծրագրերի բաժնի պետ

Աշխատանքային խմբի անդամներ՝

Սերգեյ Ադինյան - Ներդրումային ծրագրերի բաժնի
գլխավոր մասնագետ

Աշոտ Մինասյան - Ներդրումային ծրագրերի բաժնի
գլխավոր մասնագետ

Տիգրան Ներսիսյան - Ֆինանսական վերլուծության բաժնի
գլխավոր մասնագետ

Նրանուշ Սողոյան - Ներդրումային ծրագրերի բաժնի
առաջադար մասնագետ

Մեսրոպ Ղարիբյան - Ներդրումային ծրագրերի բաժնի
առաջադար մասնագետ

Լուսինե Խեչումյան - Ֆինանսական վերլուծության բաժնի
առաջադար մասնագետ

Սույն վերլուծական տեղեկանքում օգտագործվել են «Նայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից փաստացի կատարված ներդրումների և սպառողների սպասարկման որակի ցուցանիշների վերաբերյալ ՆՏ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացված հաշվետվություններում և տեղեկատվություններում արտացոլված տվյալները: Նարկ ենք համարում նշել նաև, որ ընկերության կողմից ինչպես փաստացի կատարված ներդրումների, այնպես էլ սպառողների սպասարկման

որակի ցուցանիշների վերաբերյալ հանձնաժողով ներկայացվող տեղեկատվությունները և հաշվետվությունները պարունակում են բազմաթիվ սխալներ և լրացվում են թերություններով: Առաջարկում ենք ընկերության ուշադրությունը հրավիրել այս փաստի վրա:

Մույն վերլուծական տեղեկանքում ներկայացված բոլոր դրամային ծավալները չեն ներառում ավելացված արժեքի հարկը:

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ 2005 թվականի ներդրումային ծրագիրը


«Նայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2005 թվականի տարեկան ներդրումային ծրագիրը հանդիսանում է ընկերության 2005-2007 թվականների եռամյա ներդրումային ծրագրի բաղկացուցիչ մասը: Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում նախատեսված էր տարբեր միջոցառումներ իրականացնել բաշխիչ ցանցերի վերակառուցման և վերազինման ուղղությամբ՝ սպառողների սպասարկման որակի ցուցանիշների, ինչպես նաև հուսալիության և անվտանգության աստիճանի բարձրացման և կորուստների նվազեցման նպատակով: Ներդրումներ էր նախատեսված իրականացնել նաև բաշխիչ ցանցերի շահագործման կազմակերպման և ընկերության բնականոն գործունեության ապահովման նպատակով՝ մեքենաների և մեխանիզմների, համակարգչային տեխնիկայի և փոխարկային գույքի ու գործիքների ձեռքբերման ուղղությամբ:

Ն հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը «Նայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2005-2007 թվականների ներդրումային ծրագրին համաձայնություն էր փոխել իր 2005 թվականի փետրվարի 9-ի № 13Ա որոշմամբ: Ներդրումային ծրագրով նախատեսված էր 2005-2007 թվականների ընթացքում իրականացնել 19 066,8 մլն դրամի ներդրումներ, որից 7 825,1 մլն դրամի ներդրումները՝ 2005 թվականի ընթացքում:

Գրաֆիկ 1-ում ներկայացված է ընկերության 2005 թվականի ներդրումային ծրագրի ծավալների բաշխումը հիմնական ուղղությունների միջև՝ ըստ դրանց նպատակային առանձնահատկությունների:

2005 թվականի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում բաշխիչ ցանցի լարման տարբեր մակարդակներում նախատեսված էր կառուցել կամ վերակառուցել 800 կմ-ից ավելի մալուխային և օդային գծեր, 750-ից ավելի ենթակայաններ, փոխարինել ծառայության ժամկետը սպառած տարբեր էլեկտրակայանքներ:

ԳՐԱՆԻԿ 1

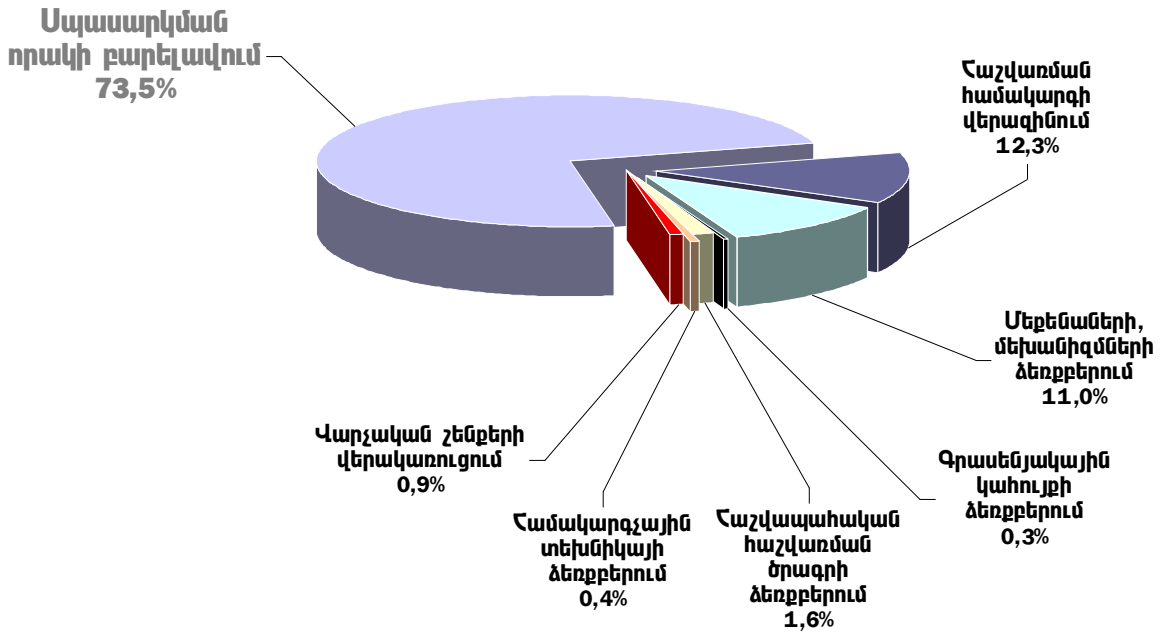

Այդ փաստը ներդրումների հիմնական մասը՝ ծրագրային ընդհանուր դրամային ծավալի շուրջ 77,5%-ը, նախատեսված էր իրականացնել 0,4 կՎ և 6(10) կՎ բաշխիչ ցանցերում, քանի որ դրանք առավել մաշված են 35 կՎ և 110 կՎ լարման ցանցերի համեմատությամբ և հաճախակի պատճառ են հանդիսանում սպառողների անպեղծ հոսանքագրկումների:

Ինչպես փաստում ենք գրաֆիկական պատկերից, ներդրումային հիմնական գերակայությունը սպասարկման որակի բարելավումն է. այն կազմում է 2005 թվականին նախատեսված ներդրումների ծավալի 73,5%-ը: Հաշվառման համակարգի բարելավման ուղղությունն իր փաստարար կշռով երկրորդն է ներդրումների ծավալում: Այս ուղղությամբ նախատեսված ներդրումների ծավալի շրջանակներում պետք է փոխարինվեն կամ փեղակայվեն նոր հաշվիչներ և հաշվիչների արկղեր՝ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոններով, դրանց ներկայացվող պահանջների ապահովման նպատակով:

Մեքենաների և մեխանիզմների ձեռքբերումը նպատակ էր հետապնդում բարձրացնել ընթացիկ շահագործման և վթարավերականգնողական աշխատանքների որակը և կրճարել դրանց իրականացման ժամանակահատվածը. այս ուղղությամբ իրականացվող ներդրումները ևս պետք է դրական ազդեցություն ունենային սպառողների սպա-

սարկման որակի ցուցանիշների վրա՝ հոսանքագրկումների փնտրության կրճատման մասով:

Ներդրումային ծրագրի մյուս ուղղություններով նախատեսված ներդրումները, որոնք կազմում են ընդհանուրի 3,2%-ը, անհրաժեշտ էին ընկերության գործունեությունը պարզաճ մակարդակով իրականացնելու համար:

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ 2005 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքները

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2005 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքները համակողմանի և համապարփակ գնահատելու նպատակով սույն վերլուծական փեղեկանքում դիտարկված է սպառողների սպասարկման որակի ցուցանիշների փաստացի վիճակը այդ ժամանակահատվածի համար և դրանց բարելավման ուղղությամբ ընկերության 2005 թվականի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում կատարված ներդրումների փաստացի ծավալները: Նարկ ենք համարում նշել, որ ներդրումային ծրագրի կատարման ցուցանիշները գնահատելիս ընկերության կողմից իրականացված ներդրումներ են համարվել 2005 թվականի ընթացքում լիցենզավորված գործունեության մեջ ներգրավված օգրակար և օգրագործվող նոր ակտիվների արժեքները: Պետք է նկատի ունենալ, որ այդ ակտիվների սպեղծման ծախսերը կարող են ամբողջությամբ իրականացված լինել ինչպես հաշվետու փարվա ընթացքում, այնպես էլ մասնակիորեն դրան նախորդող ժամանակահատվածի ընթացքում և շահագործման հանձնված լինել հաշվետու փարում: Ուստի, այդ արկիվների արժեքը չի բնորոշում ընկերության կողմից փվյալ փարվա ընթացքում ներդրումների իրականացման նպատակով ներգրավված ֆինանսական միջոցների չափը: Մինևույն ժամանակ, իրականացված ներդրումների ծավալում չի ներառվել անավարտ աշխատանքների կամ շահագործման չհանձնված ակտիվների արժեքը, քանի որ դրանք դեռևս չեն մասնակցում լիցենզավորված գործունեության իրականացմանը և ազդեցություն չեն կարող ունենալ ընկերության գործունեության ցուցանիշների վրա: Բացի նշվածը, սույն վերլուծական փեղեկանքում չեն դիտարկվել 2005 թվականի ներդրումային ծրագրի շրջանակներից դուրս իրականացված ներդրումները, քանի որ դրանք գնահատման առարկա չեն կարող հանդիսանալ ներդրումային ծրագրի կատարման ցուցանիշները դիտարկելիս: Այդ ներդրումների կառուցվածքում առկա են եղել երկու բաղադրիչներ՝ 2004 թվականի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում

սկսված, սակայն անավարտ աշխատանքներ և ներդրումներ, որոնք ներառված չեն եղել ընկերության 2004 կամ 2005 թվականների ներդրումային ծրագրերում:

Սպառողների սպասարկման որակի ցուցանիշները և դրանց բարելավման ուղղությամբ փաստացի կատարված ներդրումները

«Նայասրանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2005 թվականի ներդրումային ծրագրի այս ուղղության շրջանակներում նախատեսվում էր իրականացնել 5 748,0 մլն դրամի ներդրումներ՝ բաշխիչ ցանցերի լարման փոփոխումներ մակարդակներում օդային և մալուխային գծերի, ենթակայանների մաշված սարքավորումների և այլ էլեկտրակայանքների փոխարինման կամ նորերի կառուցման նպատակով: Այդ ներդրումները պիտի նպաստեին սպառողների հոսանքազրկումների և թույլատրելի սահմաններից էլեկտրական էներգիայի լարման շեղման դեպքերի քանակի և փակողության կրճատմանը:

Ընկերության կողմից սպառողների սպասարկման որակի ցուցանիշների վերաբերյալ հանձնաժողով ներկայացված տեղեկատվության համաձայն, 2005 թվականի ընթացքում բաշխիչ ցանցերի լարման փոփոխումներ մակարդակներում նորոգումների, սարքավորումների հրաժարման և այլ ընկերությունների (օրինակ՝ հաղորդման ցանցում տեղի ունեցած անջատումների) պատճառով գրանցվել է 7 925 անջատման դեպք՝ 27 953 ժամ ընդհանուր փակողությամբ: Նշված անջատումների արդյունքում հոսանքազրկված սպառողների թվաքանակն աճել է 5 067 836, այսինքն սպասարկված 958 702 սպառողներից յուրաքանչյուրին բաժին է ընկել առնվազն 5 անջատում: Նոսանքազրկումների հիմնական պատճառ է հանդիսացել սարքավորումների հրաժարումը, որը բնութագրում է բաշխիչ ցանցերի ներկայիս ոչ բարվոք վիճակը և խոսում ներդրումների իրականացման անհետադարձելիության մասին: 2005 թվականին սարքավորումների հրաժարման պատճառով գրանցվել է 5 519 անջատման դեպք՝ 20 639 ժամ ընդհանուր փակողությամբ: Սարքավորումների հրաժարման պատճառով տեղի ունեցած անջատումների արդյունքում հոսանքազրկված սպառողների թվաքանակն աճել է 4 097 869, կամ որ նույնն է՝ սարքավորումների հրաժարման պատճառով սպասարկված յուրաքանչյուր սպառողին բաժին է ընկել առնվազն 4 անջատում:

Գրաֆիկ 2-ում ներկայացված են սարքավորումների հրաժարման 2005 թվականի քանակական ցուցանիշները՝ ըստ ամիսների:


Error! Not a valid link.

	ԳՐԱՖԻԿԱ 2
Հունվար	275
Փետրվար	351
Մարտ	836
Ապրիլ	659
Մայիս	646
Հունիս	566
Հուլիս	442
Օգոստոս	437
Սեպտեմբեր	336
Հոկտեմբեր	377
Նոյեմբեր	279
Դեկտեմբեր	315

Գրաֆիկական պատկերում բազիսային են դիտարկվել հունվար ամսվա ցուցանիշները՝ տարվա հաջորդ ամիսների ընթացքում սարքավորումների հրաժարումների պատճառով հոսանքազրկումների դինամիկական ներկայացնելու նպատակով: Ինչպես տեսնում ենք գրաֆիկական պատկերը ինքնին բնութագրում է բաշխիչ ցանցերի վարթարացող վիճակը. հունվար ամսին, որը ամենագերբեռնվածն է տարվա ամիսներից, հոսանքազրկումները ամենաքիչն են եղել: Գարնանային անձրևները և քամիները պատճառ են դարձել զանգվածային հոսանքազրկումների:

Նույնիսկ ամռանը, երբ բեռը ամենափոքրն է, հոսանքազրկումների քանակը կրկնակի անգամ գերազանցել է հունվար ամսվա ցուցանիշը: Գրաֆիկական պատկերը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ տարեվերջին բաշխիչ ցանցերում վիճակը բարելավվելու փոխարեն վարթարացել է տարեսկզբի համեմատությամբ:

Մտորել ներկայացված է ևս մեկ գրաֆիկական պատկեր՝ հոսանքազրկված սպառողների թվաքանակի գումարի վերաբերյալ՝ ըստ տարվա ամիսների: Այս գրաֆիկական պատկերում հունվար ամսվա ցուցանիշները ևս դիտարկվել են որպես բազիսային ցուցանիշներ: Ինչպես տեսնում ենք տարվա ընթացքում դիտարկելի է հոսանքազրկված սպառողների թվաքանակի գումարի շոշափելի աճ, որի պարագայում միակ եզրակացությունը, որ կարելի է ավելացնել արդեն արվածին այն է, որ տարվա ընթացքում տեղի է ունեցել սպասարկման որակի այս ցուցանիշի անկում:

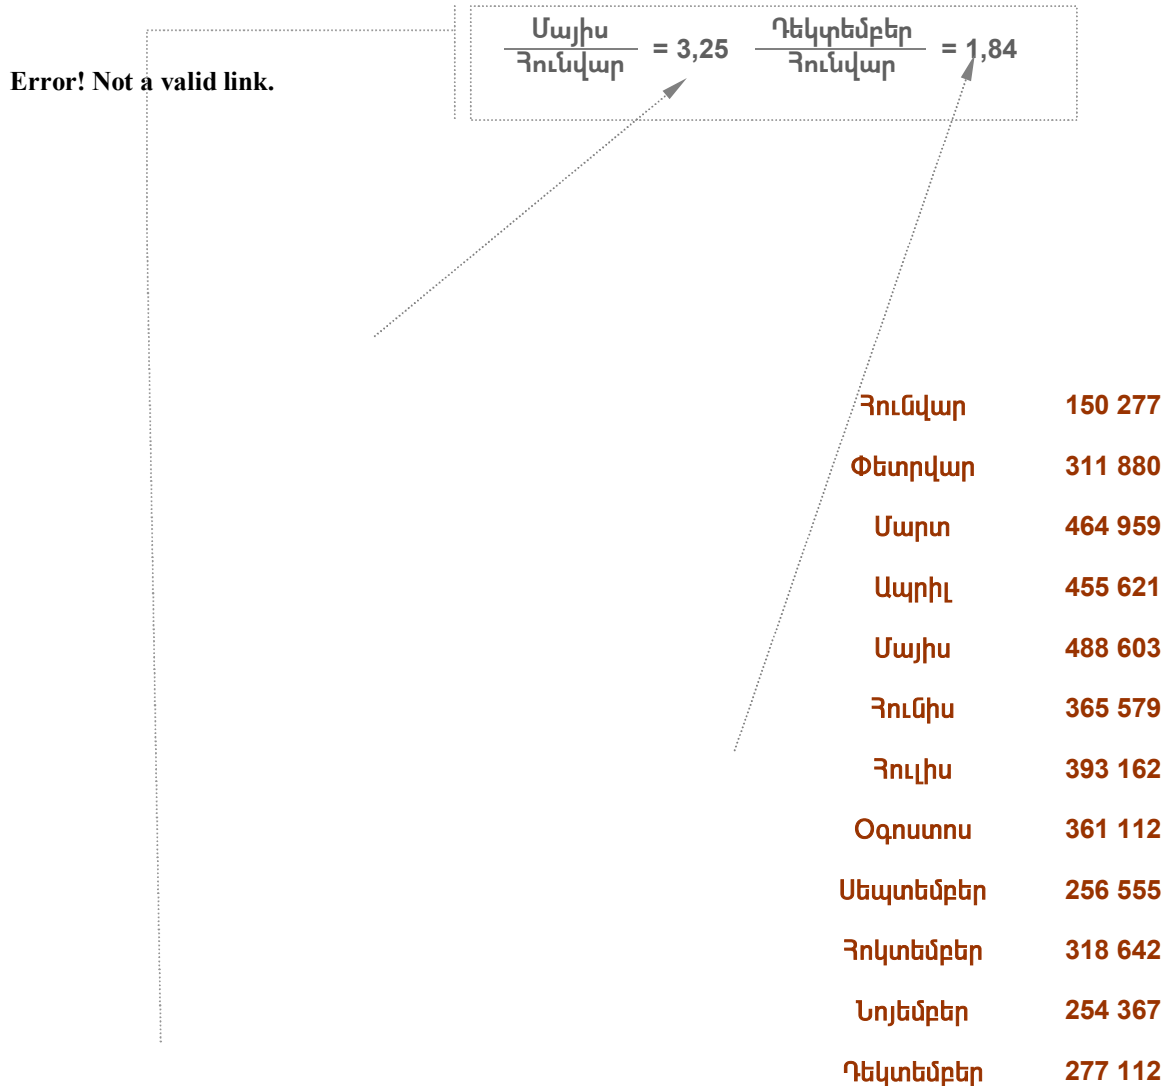

Սպասարկման որակի հաջորդ ցուցանիշը, որ դիտարկվել է սույն վերլուծական փեղեկանքում՝ թույլատրելի նորմալ սահմաններից ($\pm 5\%$ 220 Վոլտ, ԳՌՍՏ 13109-97) էլեկտրական էներգիայի լարման շեղման դեպքերի քանակը և փնտրությունն է: Այս առնչությամբ 220 Վոլտ լարման սպառողների մոտ դիտարկված առավել ուշագրավ փվյալները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում:

Ուսումնասիրելով ընկերության կողմից 2005 թվականի համար ներկայացված փեղեկարվությունը պարզ է դառնում, որ 220 Վոլտ լարման թվով 955 928 սպառողների մոտ 67%-ը ողջ փարվա ընթացքում մաքակարարվել է նորմալից ($\pm 5\%$ 220 Վոլտ) բարձր կամ ցածր լարման էլեկտրական էներգիայով: Բայց այս ցուցանիշը դեռևս ամբողջակա-

նորեն չի նկարագրում փարվա ընթացքում գրանցված լարման շեղումների դեպքերի և փնտրության ամբողջական պատկերը: Ինչպես փեսնում ենք աղյուսակ 1-ից, սպառողների որոշ մասի մոտ լարումը ցածր է եղել նույնիսկ 154 Վոլտից, կամ գերազանցել է 242 Վոլտը:

ԱՆՅՈՒՍԱԿ 1

Error! Not a valid link.

Սույն վերլուծական փեղեկանքում դիտարկվել է նաև 2005 թվականի ընթացքում սպառողների դիմում-բողոքների և հարցադրումների քանակը՝ ըստ դրանք հարուցող պատճառների: Նաշվի առնելով, որ փեղեկարվության ձևը սահմանվել է 2005 թվականի 1-ին եռամսյակի ընթացքում, փվյալները ներկայացված են դրան հաջորդող ժամանակահատվածի համար: Ինչպես փեսնում ենք աղյուսակ 2-ում ներկայացված փվյալներից, դիմում-բողոքների և հարցադրումների քանակն ունեցել է աճի փենդենց. 2005 թվականի 4-րդ եռամսյակի ընթացքում 2-րդի նկարմամբ դրանց թիվն աճել է մոտ 20%-ով, իսկ 4-րդը 3-րդի նկարմամբ՝ մոտ 26%-ով: Գրեթե բոլոր դիմում-բողոքները և հարցադրումները՝ միջին հաշվով ընդհանուրի 95%-ը, ներկայացվել են բնակչության կողմից: Սակայն, պեպք է նշենք, որ 4-րդ եռամսյակի ընթացքում 2-րդ եռամսյակի նկարմամբ կտրուկ՝ 10 անգամից ավելի, նվազել է էլեկտրամատակարարման ընդհատումների մասին դիմում-բողոքների և հարցադրումների քանակը, այն դեպքում, երբ միևնույն ժամանակահատվածում հոսանքազրկված սպառողների քանակը նվազել է ընդամենը 0,65 անգամ: Միևնույն ժամանակ, կտրուկ աճել է այլ բնույթի դիմում-բողոքների և հարցադրումների փեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում: Եթե 2-րդ եռամսյակում դրանք եղել են ընդհանուրի 14,1%-ը, ապա 4-րդ եռամսյակի ընթացքում դրանք կազմել են ընդհանուրի մոտ 50%-ը: Մեր կարծիքով փեղեկարվության ձևում դասակարգված են հիմնական բնութագրիչ դիմում-բողոքների և հարցադրումների խմբերը և առկա պատկերը կարող է միայն արդյունք լինել ընկերության կողմից հանձնաժողով ներկայացված փվյալների թերի կամ ոչ հավասարի լինելու:

Ամփոփելով կատարված դիտարկումների արդյունքները, պեպք է փաստենք, որ 2005 թվականի ընթացքում սպառողների սպասարկման որակի ցուցանիշները հոսանքազրկումների մասով փարեսկզբի համեմատությամբ բարելավվելու փոխարեն ըստ էության վատթարացել են, իսկ նորմալից բարձր կամ ցածր լարմամբ էլեկտրաէներգիա ստացած սպառողների քանակը՝ ընդհանուրի 67%-ը, խոսում է որակի այս ցուցանիշի խիստ ցածր մակարդակի մասին: Միևնույն ժամանակ փաստենք, որ ընկերության կողմից 2005 թվականին իրականացման ենթակա ներդրումների 73%-ը պեպք է նպաստեր այս ցուցանիշների բարելավմանը:

Ուսումնասիրելով փաստացի կատարված ներդրումների վերաբերյալ ընկերության կողմից հանձնաժողով ներկայացված հաշվեփվյալությունները պարզ դարձավ, որ ներդրումային ծրագրի այս հիմնական ուղղությամբ նախատեսված 5 748 մլն դրամի ներդրումների փոխարեն ընկերությունն իրականացրել է մոտ 380 մլն դրամի ներդրումներ կամ նախատեսվածի ընդամենը 6,6%-ը: Ուստի և, սպասարկման որակի ցուցանիշների ան-

կումը տրամաբանական է և պայմանավորված է ներդրումային ծրագրի այս ուղղությամբ նախատեսված ներդրումների կատարման նման ցուցանիշով:

ԱՆՅՈՒՍԱԿ 2

N	Սպառողի դիմում-բողոքի կամ հարցադրման բնույթը	II եռամսյակ		III եռամսյակ		IV եռամսյակ	
		հատ	%	հատ	%	հատ	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Էլեկտրամատակարարման ընդհատումների մասին	145	15,7	127	10,1	13	1,1
1.1	<i>այդ թվում բնակչությունից</i>	123	13,3	121	9,7	11	1,0
2	Թույլատրելի սահմաններից լարման շեղումների մասին	57	6,2	55	4,4	65	5,7
2.1	<i>այդ թվում բնակչությունից</i>	51	5,5	49	3,9	64	5,6
3	Թույլատրելի սահմաններից հաճախության շեղումների մասին	5	0,5	0	0,0	0	0,0
3.1	<i>այդ թվում բնակչությունից</i>	5	0,5	0	0,0	0	0,0
4	Առևտրային հաշվառքի սարքերի սխալ աշխատանքի մասին	481	51,9	439	35,0	381	33,2
4.1	<i>այդ թվում բնակչությունից</i>	463	50,0	407	32,5	367	32,0
5	Մատակարարի ցանցերի վիճակի մասին	51	5,5	64	5,1	57	5,0
5.1	<i>այդ թվում բնակչությունից</i>	49	5,3	62	4,9	49	4,3
6	Մատակարարի աշխատանքի (աշխատակիցների) վերաբերյալ	56	6,0	91	7,3	63	5,5
6.1	<i>այդ թվում բնակչությունից</i>	52	5,6	87	6,9	62	5,4
7	Այլ բնույթի բողոքներ	131	14,1	477	38,1	568	49,5
7.1	<i>այդ թվում բնակչությունից</i>	129	13,9	461	36,8	544	47,4
8	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	926	100,0	1 253	100,0	1 147	100,0
8.1	<i>այդ թվում բնակչությունից</i>	872	94,1	1 187	94,7	1 097	95,6

Հաշվառման համակարգի վերազինման ուղղությամբ փաստացի կատարված ներդրումները

Ներդրումային ծրագրի հաջորդ՝ հաշվառման համակարգի վերազինման ուղղությամբ նախատեսվում էր իրականացնել 966 մլն դրամի ներդրումներ: Այդ նպատակով պետք է փոխարինվեին հետագա շահագործման համար անպիտան հաշվիչները, կատարելագործվեին առևտրային հաշվառման համակարգը, տեղադրվեին չափիչ-սպուգիչ սարքավորումներ և տեղակայվեին հաշվիչների նոր արկղեր՝ հաշվառման սարքերի մեխանիկական վնասվածքները և կողմնակի անձանց միջամտությունը դրանց միացման սխեմային կամ աշխատանքին բացառելու, ինչպես նաև սպառողների և ընկերության ներկայացուցիչների համար հաշվիչի ցուցմունքի տեսանելիությունը, դրանց շահագործման և պահպանման անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Նախատեսված ներդրումները կազմում էին ծրագրի ընդհանուր դրամային ծավալի 12%-ը: Համաձայն ներկայացված հաշվետվությունների, ներդրումային ծրագրի այս ուղղությամբ նախատեսված ներդրումներն իրականացվել են 105,8%-ով:

Մեքենաների և մեխանիզմների ձեռքբերման ուղղությամբ փաստացի կատարված ներդրումները

Այս ուղղությամբ ընկերությունը նախատեսում էր իրականացնել 862,7 մլն դրամի ներդրումներ՝ 117 միավոր մեքենաների և մեխանիզմների ձեռքբերման նպատակով: Այն կազմում էր ծրագրի ընդհանուր դրամային ծավալի 11%-ը: Նախատեսված ներդրումները ընթացիկ շահագործման և վթարավերականգնողական աշխատանքների որակը բարձրացնելու, դրանց իրականացման ժամանակահատվածը կրճատելու նպատակով պետք է նպատակաուղղվեին բեռնատար, հատուկ, վթարավերականգնողական մեքենաների և մեխանիզմների ձեռքբերմանը:

2005 թվականի ընթացքում ընկերությունը ձեռք է բերել 70,2 մլն դրամի 24 միավոր մեքենաներ, որոնցից 18 միավորը՝ մարդատար: Ծրագրի այս ուղղությունը, որը ևս պիտի նպաստեր սպառողների սպասարկման որակի ցուցանիշների բարելավմանը, ընկերությունը կատարել է ընդամենը 8,1%-ով:

Այլ ուղղություններով նախատեսված ներդրումների կադարման փաստացի ցուցանիշները

Ներդրումային ծրագրի մնացած ուղղություններով նախատեսվում էր հաշվապահական հաշվառման նոր ծրագրային փաթեթի, համակարգչային տեխնիկայի, վարչական շենքերի վերակառուցման և գրասենյակային կահույքի ձեռքբերման նպատակով իրականացնել մոտ 248 մլն դրամի ներդրումներ՝ ծրագրային ծավալի 3%-ի չափով, որից 124 մլն դրամը՝ հաշվապահական հաշվառման ծրագրային փաթեթի ձեռքբերման նպատակով:

Փաստացի կատարված ներդրումների վերաբերյալ տվյալների ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ ընկերությունը ձեռք չի բերել նախատեսված հաշվապահական հաշվառման նոր ծրագիրը, սակայն համակարգչային տեխնիկայի, գրասենյակային կահույքի ձեռքբերման և վարչական շենքերի վերակառուցման ուղղությամբ նախատեսված ներդրումները համապատասխանաբար իրականացրել է 195,1 %-ով, 394,8 %-ով և 152,1 %-ով: Սրանք ներդրումային ծրագրի միակ ուղղություններն են, որ ոչ թե լիարժեք կատարված են, այլ գերակատարված:

«Նայասարանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ 2005 թվականի ներդրումային ծրագրի կատարման ամփոփ ցուցանիշները

Ստորև՝ աղյուսակ 3-ում, ներկայացված է «Նայասարանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2005 թվականի ներդրումային ծրագրի կատարման ցուցանիշների ամփոփ գնահատականը (աղյուսակ 3, 7-րդ սյուն)՝ ըստ նպատակային ուղղությունների, ինչպես նաև հանձնաժողովի հետ համաձայնեցված և փաստացի կատարված ներդրումների փաստագրեր կշիռը՝ ծրագրային և փաստացի կատարված ներդրումների ընդհանուր ծավալի նկատմամբ (աղյուսակ 3, 4-րդ և 6-րդ սյուններ):

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3

N	Ներդրումային ծրագրի ուղղությունը, ենթաուղղությունը	Հանձնաժողովի հետ համաձայնեցված 2005 թվականի ներդրումների կանխատեսվող ծավալը		2005 թվականի ընթացքում փաստացի կատարված ներդրումների ծավալը		Ներդրումային ծրագրի կատարման տոկոսը
		մլն դրամ	%	մլն դրամ	%	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Սպասարկման որակի բարելավում	5 747,97	73,5	379,06	21,6	6,6%
2	Հաշվառման համակարգի վերազինում	966,11	12,3	1 022,06	58,1	105,8%
3	Մեքենաների, մեխանիզմների ձեռքբերում	862,70	11,0	70,19	4,0	8,1%
4	Հաշվապահական հաշվառման ծրագրի ձեռքբերում	123,90	1,6	8,07	0,5	6,5%
5	Գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում	20,81	0,3	40,61	2,3	195,1%
6	Համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում	33,57	0,4	132,55	7,5	394,8%
7	Վարչական շենքերի վերակառուցում	70,00	0,9	106,44	6,1	152,1%
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		7 825,06	100	1 758,97	100,0	22,5%

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ 2005 թվականի ներդրումային գործունեության համապարփակ գնահատականը

Այսպիսով, ամփոփելով «Նայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2005 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքները պետք է փաստել՝

1. 2005 թվականի տարեվերջին հոսանքազրկումների քանակը աճել է տարեսկզբի համեմատությամբ, իսկ տարվա ընթացքում դիտարկվել է հոսանքազրկումների քանակի կտրուկ աճ,
2. հոսանքազրկումների հիմնական պատճառ է հանդիսացել սարքավորումների հրաժարումը, մեկ սպառողին բաժին է ընկել 5 անջատում, որից 4-ը սարքավորումների հրաժարման պատճառով,
3. բազմաթիվ են թույլատրելի սահմաններից լարման շեղման դեպքերը. սպառողների մոտ 67%-ը ողջ տարվա ընթացքում մարակարարվել է նորմալից ($\pm 5\%$ 220 Վոլտ) բարձր կամ ցածր լարման էլեկտրական էներգիայով: Մինևույն ժամանակ, միջին տարեկան հաշվով 35 000-ից ավելի սպառողների մոտ լարումն անընդհար գերազանցել է 242 Վոլտը: Եղել են նաև դեպքեր, երբ լարումը մոտ 14 000 սպառողների մոտ մեկ ամսից ավելի ցածր է եղել նույնիսկ 154 Վոլտից,
4. այս պայմաններում ընկերության 2005 թվականի ներդրումային ծրագիրը կատարվել է 22,5%-ով, ընդ որում ներդրումային ծրագրի գերակա ուղղությունը՝ սպառողների սպասարկման որակի բարելամանն ուղղված ներդրումները, կատարվել է 6,6%-ով:

Նաշվի առնելով վերը նշվածը, պետք է եզրակացնել, որ «Նայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2005 թվականին իրականացված փոքրածավալ ներդրումները չեն նպաստել սպառողների սպասարկման որակի ցուցանիշների բարելամանը: Փոխարենը 2005 թվականի ընթացքում սպառողների սպասարկման որակի ցուցանիշները հոսանքազրկումների մասով տարեսկզբի համեմատությամբ ըստ էության վարթարացել են, իսկ նորմալից բարձր կամ ցածր լարմամբ էլեկտրաէներգիա ստացած սպառողների քանակը, խոսում է որակի այս ցուցանիշի խիստ ցածր մակարդակի մասին:

ԱՎԱՐՏ
