

«Նայաստրանի Էլեկտրական Ցանցեր» ՓԲԸ

2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ի ° ԾԵՁՈՒ ԶԻԶՍԻ° Օ° Ի Զ Ս Յ

ԹԹ Թ² ՍԾ² ՍՔՍ Ի Զ Ե² ՍձՁՁՁՁՁՁՁՁՁՁ ԾԱ Ի Զ ԾՂ² Ի ձԾձՁ Թ² ՍԾՍ² ԱձՕձ

ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Սույն վերլուծական փեղեկանքը կազմվել է հաշվի առնելով «Նայասպրանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից 2007-2009 թվականների համար ՆՏ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հետ 2007 թվականի ապրիլի 10-ի №167Ա որոշմամբ (2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N04-ՎԱ-05/5407 գրությամբ «Նայասպրանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ն դիմել էր հանձնաժողով 2007-2009 թվականի ներդրումային ծրագրի 2007 թվականի ներդրումների ծավալում փոփոխություններ կատարելու համար: Առաջարկվող փոփոխությունները նույնպես հաշվի են առնվել սույն վերլուծական փեղեկանքում:) համաձայնեցված ներդրումային ծրագրի շրջանակներում 2007 թվականին իրականացված փաստացի ներդրումների վերաբերյալ ընկերության 2008 թվականի մայիսի 30-ի №05-ԵԳ-05/2830 գրությամբ ներկայացված հաշվետվությունը:

«Նայասպրանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ 2007 թվականի ներդրումային ծրագիրը


«Նայասպրանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2007 թվականի փարեկան ներդրումային ծրագիրը հանդիսանում է ընկերության 2007-2009 թվականների եռամյա ներդրումային ծրագրի բաղկացուցիչ մասը: Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում նախատեսված է փարբեր միջոցառումներ իրականացնել բաշխիչ ցանցերի վերակառուցման և վերազինման ուղղությամբ՝ սպառողների սպասարկման որակի ցուցանիշների, ինչպես նաև հուսալիության և անվտանգության աստիճանի բարձրացման նպատակով: Նախատեսված է ներդրումներ իրականացնել նաև բաշխիչ ցանցերի ընդլայնման, այլ նաձանց պարկանող ցանցերի ձեռքբերման, ընթացիկ ծախսերի կրճատման, բաշխիչ ցանցերի շահագործման կազմակերպման և ընկերության բնականոն գործունեության ապահովման նպատակով, համակարգչային տեխնիկայի, փնտեսական գույքի, արտադրական և փնտեսական գործիքների ձեռքբերման ուղղություններով:

ՆՏ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը «Նայասպրանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2007-2009 թվականների ներդրումային ծրագրին համաձայնություն էր տվել իր 2007 թվականի ապրիլի 10-ի №167Ա որոշմամբ: Ներդրումային ծրագրով նախատեսված էր 2007-2009 թվականների ընթացքում

իրականացնել 26 961,9¹ մլն դրամի ներդրումներ, որից 12 207,0 մլն դրամը՝ 2007 թվականի ընթացքում: 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N04-ՎԱ-05/5407 գրությամբ «Նայասարանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ն դիմել էր հանձնաժողով 2007-2009 թվականի ներդրումային ծրագրի 2007 թվականի ներդրումների ծավալում փոփոխություններ կատարելու համար: Առաջարկված փոփոխությունները, համաձայն հանձնաժողովի 30.11.2007թ. NՌՆ-2310Լ գրության՝ բացառությամբ բաշխիչ ցանցերի շահագործման կազմակերպման և ընկերության բնականոն գործունեության ապահովման նպատակով նախատեսված ներդրումների 7-րդ հավելվածում առաջարկվող փոփոխությունների, նույնպես հաշվի են առնվել սույն վերլուծական փեղեկանքում: Այսպիսով 2007 թվականի ընթացքում ընկերությունը նախատեսում էր իրականացնել 10 911,9 մլն դրամի ներդրումներ:

Գրաֆիկ 1-ում ներկայացված է ընկերության 2007 թվականի ներդրումային ծրագրի ծավալների բաշխումը հիմնական ուղղությունների միջև՝ ըստ դրանց նպատակային առանձնահատկությունների:

ԳՐԱՖԻԿ 1

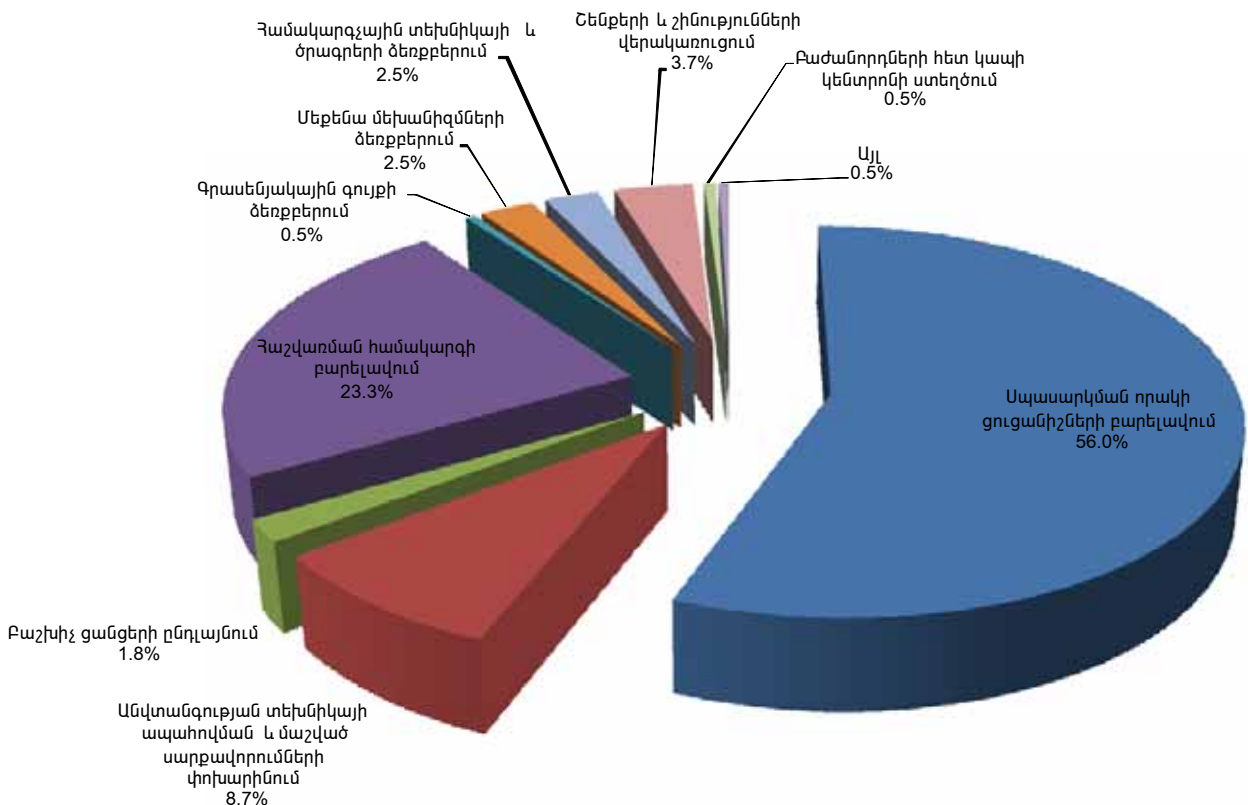

¹ Սույն վերլուծական փեղեկանքում ներկայացված բոլոր գումարները չեն ներառում ավելացված արժեքի հարկը:

Ինչպես երևում է գրաֆիկ 1-ից, ներդրումների հիմնական մասը՝ շուրջ 56 %-ը, նախատեսված է սպասարկման որակի ցուցանիշների բարելավման նպատակով ուղղել մալուխային և օդային գծերի ու ենթակայանների վերակառուցմանը, վերագինմանը և նորերի կառուցմանը:

Նաշվառման համակարգի բարելավմանն ուղղված ներդրումները իրենց փոխարար կշռով երկրորդն են: Այդ նպատակով պետք է փոխարինվեն կամ փոխակալվեն նոր հաշվիչներ և հաշվիչների արկղեր՝ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոններով, դրանց ներկայացվող պահանջների ապահովման նպատակով: Նախատեսվում էր նաև փոխակալված հաշվիչների կապիտալ վերանորոգման ինչպես նաև 0.4 և 6(10) կՎ լարման ցանցերում հաշվառման համակարգի ավտոմատացման աշխատանքներ:

Ներդրումների մյուս խոշոր ուղղությունը անվրանգության փոխանակայի ապահովման և մաշված սարքավորումների փոխարինման ուղղությունն է: Այս ուղղությամբ նախատեսվում էր ներդնել 950.9 մլն դրամ՝ ընդհանուրի 8.7%-ը:

200 մլն դրամ՝ ընդհանուրի 1.8%-ը նախատեսվում էր ներդնել բաշխիչ ցանցերի ընդլայնման և այլ անձանց պարկանող ցանցերի ձեռք բերման ուղղությամբ:

60 մլն դրամ ընդհանուր ծավալով ներդրումներ էր նախատեսվում կատարել բաժանորդների հետ կապի կենտրոնի սրբեղծման համար համակարգիչների, ծրագրերի, կահույքի և բջջային հեռախոսների ձեռքբերման համար:

Ներդրումային ծրագրի մյուս ուղղություններով նախատեսված ներդրումները, որոնք կազմում են ընդհանուրի 9.6%-ը, պետք է իրականացվեն վարչական շենքերի վերակառուցման, մեքենա-մեխանիզմների, գրասենյակային գույքի, համակարգչային փոխանակայի, հաշվապահական հաշվառման և կառավարման ծրագրերի ձեռքբերման ինչպես նաև բաժանորդների հետ կապի կենտրոնի սրբեղծման ուղղությամբ: Նշված բոլոր ուղղությունները բացառությամբ համակարգչային փոխանակայի և արքեստուարների ձեռք բերման ուղղությամբ ներդրումները գերակատարվել են: Արդյունքում այս ուղղություններով նախատեսված 1051.0 մլն դրամի դիմաց 2007 թվականի ընթացքում իրականացվել են 1402.3 մլն դրամի ներդրումներ:

«Նայասփանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ 2007 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքները

Նամաձայն «Նայասփանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի փաստացի իրականացված ներդրումների մասին հաշվետվության, ընկերությունը 2007 թվականի

ընթացքում կարարել է 13 431,9 մլն դրամի ներդրումներ², որի արդյունքում շահագործման են հանձնվել 11 993,9 մլն դրամի հիմնական միջոցներ: Մնացած 1438,0 մլն դրամի աշխատանքները մնացել են անավարտ:

Ստորև՝ աղյուսակ 1-ում, ներկայացված է ընկերության կողմից փաստացի իրականացված և հանձնաժողովի հետ համաձայնեցված ներդրումների ծավալների համեմատականը:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

N	Ներդրումային ծրագրի ուղղությունը, ենթաուղղությունը	Հանձնաժողովի հետ համաձայնեցված 2007 թվականի ներդրումների կանխատեսվող ծավալը		2007 թվականի ընթացքում փաստացի կատարված ներդրումների ծավալը		Ներդրումային ծրագրի կատարման ցուցանիշը
		մլն դրամ	%*	մլն դրամ	%*	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Սպասարկման որակի ցուցանիշների բարելավում	6 111.4	56%	6 999.1	52%	114.5%
2	Անվտանգության տեխնիկայի ապահովման և մաշված սարքավորումների փոխարինում	950.9	9%	1 004.6	7%	105.6%
3	Բաշխիչ ցանցերի ընդլայնում	200.0	2%	237.9	2%	118.9%
4	Նաշվառման համակարգի բարելավում	2 538.7	23%	3 234.1	24%	127.4%
5	Բաժանորդների հետ կապի կենտրոնի ստեղծում	60.0	1%	36.0	0%	60.0%
6	Գրասենյակային գույքի ձեռքբերում	50.0	0.5%	71.3	1%	142.7%
7	Մեքենա մեխանիզմների ձեռքբերում	275.8	3%	308.3	2%	111.8%
8	Նամակարգչային տեխնիկայի և արժեստուարների ձեռքբերում	134.7	1%	68.7	1%	51.0%
9	Նաշվապահական հաշվառման և կառավարման նոր ծրագրային փաթեթի ձեռքբերում	140.0	1%	197.7	1%	141.2%
10	Շենքերի և շինությունների վերակառուցում	400.0	4%	651.6	5%	162.9%
11	Այլ	50.5	0.5%	104.6	1%	207.2%
12	Նրափաստ ներդրումներ			216.5	2%	
13	Ներդրումային ծրագրով չնախատեսված ներդրումներ և անհատույց ստացված հիմնական միջոցներ			301.7	2%	
14	Ընդամենը	10 911.9	100%	13 432.3	100%	123.1%

² 2007 թվականի ընթացքում իրականացված ներդրումների ծավալում ներառված են նաև նախորդ ժամանակաշրջանում իրականացված 925,5 մլն դրամի աշխատանքները, որոնք շահագործման են հանձնվել 2007 թվականին:

	Ներդրումների ձևավորման աղբյուրները	Իրականացված ներդրումների ծավալները
1	2	3
1	Նախորդ ժամանակահատվածում իրականացված ներդրումներից	925.5
2	Կողմնակի կազմակերպությունների միջոցով կապարված աշխատանքներից	5779.5
3	Տեղակայում չպահանջող հիմնական միջոցներից	3831.0
4	Սեփական ուժերով կապարված աշխատանքներից	2896.3
4.1	<i>ՅԵՅ ի Յ ի Յ ըՕ " ԵձՕՇՅ ԲՅ ԻՅ Կ Յ Գ Յ Նձձ ձձձՅ Կ ԻՅ ԵՅ»ձ</i>	822.4
4.2	<i>Նձձձ " Կձձձ»ձ</i>	1864.9
4.3	<i>ի »ՕՅ ԻՅ ԿՅ Կ»ԿձՅ ԻՅ ԵՅ ըձՅ ի ԳձձձԿ»ձ</i>	208.9
4.4	<i>Յ Կ</i>	0.0
5	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	13432.3

Ինչպես փաստում ենք աղյուսակ 2-ից, ընկերությունը 2007 թվականին ներդրումների իրականացման նպատակով ներգրավել է 13432.3 մլն դրամ, որից 925.5 մլն դրամը նախորդ ժամանակաշրջանում իրականացված ներդրումներն են: Ներդրումների 43%-ը, իրականացվել է այլ կազմակերպությունների միջոցով: Սեփական ուժերով կապարված ներդրումների ծավալը կազմել է ընդհանուրի մոտ 22%-ը:

Ստորև, առավել հանգամանալից ըստ ուղղությունների, ներկայացված են ընկերության կողմից 2007 թվականին իրականացված ներդրումների ծավալները հետազայում դրանք սակագնով ամբողջությամբ կամ մասնակի փոխհատուցման փասանկյունից: Նարկ ենք համարում նշել, որ սույն վերլուծական փեղեկանքում սակագնով փոխհատուցման ենթակա ներդրումների ներկայացված ծավալը վերջնական չէ և հետազայում կարող է ճշգրտվել մոնիթորինգի իրականացման արդյունքներով:

Նարկ ենք համարում նշել, որ իրականացված ներդրումների ծավալում առկա են այնպիսի աշխատանքներ, որոնք չեն ընդունվել հանձնաժողովի աշխատակազմի կողմից՝ մասնավորապես.

1. ընկերության 4 մասնաճյուղերում իրականացված 325 մլն դրամ ընդհանուր ծավալով ասֆալտապարման աշխատանքներից նվազեցվել են 171.14 մլն

- դրամի ներդրումները՝ հաշվի առնելով այդ մասնաճյուղերի (վարչական շենքերի) փարածքները և ասֆալտապատման աշխատանքների գները,
2. արտաքին լուսավորության աշխատանքները՝ 68.58 մլն դրամ ընդհանուր ծավալով, քանի որ դրանք չեն բխում ընկերության լիցենզավորված գործունեությունից,
 3. 17.1 մլն դրամ ընդհանուր արժեքով 4 աշխատանքներ, որոնց իրականացման վայրի և բնույթի վերաբերյալ ընկերությունը հիմնավորումներ չի ներկայացրել,
 4. 458 անվանում մինչև 25000 դրամ արժեքով աշխատանքները ընդհանուր 7.83 մլն դրամ ծավալով, քանի որ անհասկանալի է այդ աշխատանքների որպես ներդրում դիտարկելու հանգամանքը,
 5. 2007 թվականի ընթացքում ձեռք բերված 683.7 մլն դրամի հաշվիչների արկղերի արժեքից 288.6 մլն դրամը՝ հաշվի առնելով դրանց հաշվապահական հաշվառման փվյալների հետ համադրության և արկղերի ձեռքբերման արժեքների ուսումնասիրության արդյունքները,
 6. սպառողների հաղորդարների և պատրաստների փոխարինման ուղղությամբ իրականացված 21.1 մլն դրամ ներդրումները, որոնց իրականացման վայրերի և ծավալների վերաբերյալ ընկերությունը փեղեկավորություն չի ներկայացրել,
 7. անհատույց սրացված հիմնական միջոցների արժեքը՝ 57.1 մլն դրամ,
 8. հրապապ ներդրումների ծավալը՝ 76.7 մլն դրամ, քանի որ դրանք սահմանված կարգով չեն հիմնավորվել,
 9. ներդրումային ծրագրով չնախատեսված ներդրումները՝ 74.2 մլն դրամ:

Այսպիսով սակագնային մարժայով փոխհատուցվող ներդրումների ծավալի որոշման ժամանակ ներդրումների ընդհանուր ծավալից ենթակա է նվազեցման 782.3 մլն դրամ:

Սպասարկման որակի բարելավմանն ուղղված ներդրումները

Այս ուղղությամբ «Նայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի 2007 թվականի ներդրումային գործունեության արդյունքները համակողմանի և համապարփակ գնահատելու նպատակով կատարվել է այդ ժամանակահատվածում սպառողների սպասարկման որակի ցուցանիշների համեմատություն 2007 թվականի ծրագրային և 2006 թվականի ցուցանիշների հետ:

Սպասարկման որակի բարելավման նպատակով ընկերության 2007 թվականի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում էր իրականացնել 6111.4 մլն

դրամի ներդրումներ՝ բաշխիչ ցանցերի լարման փարբեր մակարդակներում օդային և մալուխային գծերի, ենթակայանների վերանորոգման, վերակառուցման և նորերի կառուցման նպատակով: Նաշվի առնելով նշված ներդրումների ծավալները հաստատվել էին սպասարկման որակի ցուցանիշների ծրագրային մեծությունները, որոնք ենթադրում էին բոլոր սպասարկման որակի ցուցանիշների գրեթե հավասարաչափ բարելավում՝ 3-4%-ով 2006 թվականի նկատմամբ: Այդ ժամանակահատվածում ընկերությունը ներդրել է 6999.1 մլն դրամ գումար, սակայն ոչ բոլոր աշխատանքներն են ավարտվել. իրականացված ներդրումների արդյունքում շահագործման են հանձնվել 6279.6 մլն դրամի հիմնական միջոցներ, (նշված ծավալում 740.7 մլն դրամի աշխատանքները նախորդ ժամանակաշրջանում իրականացված աշխատանքներն են) որոնք և կարող էին ազդեցություն ունենալ սպասարկման որակի ցուցանիշների վրա: Նարկ ենք համարում նշել նաև, որ այս ուղղությամբ նախանշված ներդրումները ծրագրայինը գերազանցել են 672.9 մլն դրամով:

Սպորտ և ներկայացվում է 2007 թվականի ընթացքում սպառողների հոսանքազրկումների միջին հաճախության և փոփոխության ցուցանիշների համեմատությունը 2006 թվականի փաստացի և 2007 թվականի ծրագրային ցուցանիշների հետ:

ԱՂՅՈՒՄԱԿ 3

Սպասարկման փարածքը	Չափի միավոր	2006թ. փաստացի	2007թ. ծրագրային	2007թ. ծրագրայինի փոփոխությունը 2006թ. փաստ-ի նկատմամբ	2007թ. փաստացի	2007թ. փաստ-ի փոփոխությունը 2006թ. փաստ-ի նկատմամբ	2007թ. փաստ-ի փոփոխությունը 2007թ. ծրագրայինի նկատմամբ
միջին հաճախություն							
Նայասարկման հանրապետություն	հոսանքազրկում սպառող	5.72	5.55	3.0%	5.85	-2.3%	-5.4%
	ք. Երևան	6.78	6.58	2.9%	6.47	4.6%	1.7%
ՆՆ մարզեր	հոսանքազրկում սպառող	5.14	4.99	2.9%	5.52	-7.4%	-10.6%
միջին փոփոխություն							
Նայասարկման հանրապետություն	բոլոր սպառող	938.5	907.1	3.3%	993.04	-5.8%	-9.5%
	ք. Երևան	695.76	670.8	3.6%	673.88	3.1%	-0.5%
ՆՆ մարզեր	բոլոր սպառող	1069.59	1035.4	3.2%	1165.07	-8.9%	-12.5%
լարման շեղման միջին							
Նայասարկման հանրապետություն	շեղում սպառող	16.77	16.16	3.6%	15.36	8.4%	5.0%
	ք. Երևան	13.61	13.22	2.9%	10.49	22.9%	20.7%
ՆՆ մարզեր	շեղում սպառող	18.47	17.75	3.9%	17.99	2.6%	-1.4%
լարման շեղման միջին							
Նայասարկման հանրապետություն	ժամ սպառող	2963.3	2835.7	4.3%	2720.01	8.2%	4.1%
	ք. Երևան	2370.01	2290.4	3.4%	1815.13	23.4%	20.8%
ՆՆ մարզեր	ժամ սպառող	3283.71	3132.2	4.6%	3207.79	2.3%	-2.4%

Ինչպես նշեցինք 2007 թվականի ընթացքում նախատեսվում էր սպասարկման որակի ցուցանիշների 3-4%-ով բարելավում: Սպառողների հոսանքազրկումների

հաճախության ցուցանիշը Նայասպանի Նանրապեության փարածքի համար նախատեսվում էր կրճատել 3%-ով: Սակայն 2007 թվականի ընթացքում այս ցուցանիշը ոչ թե բարելավվել է, այլ ընդհակառակը՝ վարթարացել: Նշենք, որ վարթարացումը փեղի է ունեցել ի հաշիվ մարզերում սպառողների հոսանքագրկումների հաճախության ցուցանիշի ավելի քան 7%-ով անկման: Ինչ վերաբերում է Երևան քաղաքի սպառողների հոսանքագրկումների հաճախության ցուցանիշին ապա այն բարելավել է և նույնիսկ գերազանցել է ծրագրային մեծությունը: Սպառողների հոսանքագրկումների փնդության ցուցանիշը, որը Նայասպանի Նանրապեության փարածքի համար նախատեսվում էր կրճատել 3.3%-ով, նույնպես վարթարացել է, և նույնպես ի հաշիվ մարզերում այդ ցուցանիշի զգալի՝ 9% անկմամբ: Այս դեպքում ևս Երևան քաղաքի ցուցանիշը բարելավել է:

Ինչ վերաբերում է լարման շեղման հաճախությունների և փնդության ցուցանիշներին, դրանք և Երևան քաղաքի և մարզերի դեպքում բարելավվել են: Եթե մարզերի պարագայում այդ ցուցանիշները չեն հասել ծրագրայինին և կազմել են համապատասխանաբար 2.6% և 2.3%, ապա Երևան քաղաքի համար այդ ցուցանիշները և հաճախության և փնդության պարագայում բարելավվել են մոտ 23%-ով:

Այս առնչությամբ «Նայասպանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ն հանձնաժողով է ներկայացրել սպասարկման որակի ծրագրային և փաստացի ցուցանիշների շեղումների իր հիմնավորումները որոնք հետևյալն են.

1. ներդրումների իրականացման նպատակով աճել են պլանային և արտապլանային անջատումների քանակը,
2. որոշ մասնաճյուղերում փարերային աղեպներով պայմանավորված ընդհատումները դասվել են ընկերության էլեկտրակայանքների հրաժարման հետևանքով անջատումների թվին,
3. 2004-2006 թվականների բազային փվյալների ցածր հավաստիությունը:

Ներկայացված պարճառների հիմնավորվածությունը պարզելու նպատակով իրականացված ներդրումները ուսումնասիրվել են ըստ փարաճաշրջանների և ընդհատումների պարճառների:

Ստորև ներկայացվում է 2007 թվականի ընթացքում ընդհատումների փնդության և քանակի ցուցանիշների համեմատությունը 2006 թվականի հետ:

ընդհատումների փնտրությունը												
Ժամանակա հատված	Երևան						Մարզեր					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
2006թ.	101.92	33.43	560.41	21.00			103.73	61.04	904.82	37.59		
2007թ.	57.08	26.03	590.77	19.65	0.45	9.39	119.23	158.86	886.99	23.36	11.06	44.64
ընդհատումների քանակը												
2006թ.	0.83	0.22	5.73	0.26			0.64	0.45	4.05	0.17		
2007թ.	0.54	0.20	5.73	0.34	0.00	0.01	0.76	0.86	3.90	0.13	0.05	0.12

Աղյուսակում բերված 1-ից 6 թվերը ընդհատումների պատճառներն են, որոնք ներկայացվում են ստորև.

1. մաքակարարի բաշխիչ ցանցի էլեկտրակայանքի պլանային նորոգման պատճառով,
2. մաքակարարի բաշխիչ ցանցի էլեկտրակայանքի արտահերթ նորոգման պատճառով,
3. մաքակարարի բաշխիչ ցանցի էլեկտրակայանքի հրաժարման պատճառով,
4. այլ ընկերությունների պատճառով՝ բացառությամբ սպառողների,
5. սպառողների պատճառով,
6. մաքակարարի գործունեության վրա ազդեցություն ունեցած ֆորս-մաժորի պատճառով,

Նամաձայն ներկայացված հաշվետվության սպառողների ընդհատումների քանակի և փնտրության կրճատման ուղղությամբ 2007 թվականի ընթացքում ներդրվել է 5166.6 մլն դրամ, որից 3045.7 մլն դրամը Երևանում իսկ մնացած 2121 մլն դրամը մարզերում: Եթե համեմատենք 2007 թվականին պլանային և արտահերթ նորոգման պատճառով անջատումների քանակը 2006 թվականի հետ, ապա կրեսնենք, որ Երևանում իրականացվել է ներդրումների մոտ 60%-ը, սակայն պլանային և արտահերթ նորոգումների հետևանքով անջատումները 2006 թվականի համեմատությամբ նվազել են: Իսկ մարզերում պարկերը հակառակն է. ներդրումների քանակը ավելի քիչ է քան Երևանում, սակայն պլանային և արտահերթ նորոգման պատճառով անջատումների քանակը աճել է: Այս համեմատությունը թույլ է փախս եզրակացնել, որ ընկերության կողմից իրականացված ներդրումների արդյունքում չէ, որ աճել է պլանային և արտահերթ նորոգումների պատճառով ընդհատումների քանակը:

Նաջորդ պարամառաբանությունը վերաբերում էր մի շարք մասնաճյուղերում փարերային աղեպներով պայմանավորված ընդհատումները ընկերության էլեկտրակայանքների հրաժարման հետևանքով անջատումների թվին դասելուն, որի առնչությամբ ընկերությունը նշեց, որ որևէ հիմնավորում ներկայացնել չի կարող:

Ինչ վերաբերում է 3-րդ պարամառաբանությանը, ապա հարկ ենք համարում նշել, որ ընկերությունը բազմիցս վստահեցրել է, թե ներկայացվող փոխվելերը ունեն բարձր հավաստիության աստիճան: Ուստի ընկերության ուշադրությունն ենք հրավիրում այս հանգամանքի վրա և կարծում ենք, որ ընկերությունը բավարար ջանքեր չի գործադրել այս ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները հավուր պարզաճին կարարելու համար, ինչը և պարճառ է հանդիսանում նման իրարամերժ հայրարարությունների համար:

Ամփոփելով այս ուղղությամբ իրականացված ներդրումների արդյունքները նշենք, որ ճնայած իրականացված ներդրումների ծավալին սպասարկման որակի ցուցանիշները ճն բարելավվել: Ուստի առաջարկում ենք ճրագրային ներդրումների գերազանցող ծավալը՝ 672.9 մլն դրամ, նվազեցնել սակագնային մարճայով փոխհարուցման ենթակա ներդրումների ծավալից:

Նաշվառման համակարգի վերազինման ուղղությամբ կարարված ներդրումները

Ներդրումային ճրագրի հաջորդ՝ հաշվառման համակարգի վերազինման ուղղությամբ նախարեսվում էր իրականացնել 2538.7 մլն դրամի ներդրումներ: Այդ նպարակով պերք է փոխարինվելին հերագա շահագորճման համար անպիրան հաշվիչները, կարարելագորճվեր առնիրային հաշվառման համակարգը և րեղակայվելին հաշվիչների նոր արկղեր՝ հաշվառման սարքերի մելանիկական վնասվաճքները և կողմնակի անճանց միջամրությունը դրանց միացման սխեմային կամ աշխարանքին բացառելու, ինչպես նան սպառողների և ընկերության ներկայացուցիչների համար հաշվիչի ցուցմունքի րեսանելիությունը՝ դրանց շահագորճման և պահպանման անվրանգությունը ապահովելու նպարակով: Նախարեսվում էր նան իրականացնել հաշվիչների կարարալ նորոգման աշխարանքներ 550 մլն դրամ ընդհանուր արճերով:

Նամաճայն ներկայացված հաշվերվության, այս ուղղությամբ ընկերությունն իրականացրել է 3234.1 մլն դրամի ներդրումներ, այդ թվում՝

- հաշվիչների փոխարինման նպարակով՝ 1545.5 մլն դրամ, որից 1318.3 մլն դրամը սպառողների համար միաֆազ էլեկրոնային բազմասակագնային հաշվիչների րեղադրման նպարակով: Նարկ ենք համարում նշել, որ այս

ներդրումները «Էլեկտրական էներգիայի մաքակարարման և օգտագործման կանոններով» սահմանված կարգով հիմնականում իրականացվում են սպառողների միջոցների հաշվին, իսկ ընկերությունը դրանք փոխհատուցում է հաշվիչը սպառողի մոտ փողակայելուց մեկ փարի հետո՝ էլեկտրական էներգիայի ծախսի հաշվին: Նաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ միաֆազ բազմասակագնային էլեկտրոնային հաշվիչների փողակայումը իրականացվում է բաժանորդների նախաձեռնությամբ և ընկերությունը այս ուղղությամբ ճշգրիտ կանխատեսումներ կարարել չէր կարող, առաջարկում ենք այս ենթաուղղությամբ ներդրումների գերազանցող մասը չնվազեցնել սակագնային մարժայով փոխհատուցման ենթակա ներդրումների ծավալից:

- սպառողների մոտ փողակայված հաշվիչների կապիտալ նորոգման նպատակով՝ 652.5 մլն դրամ:
- հաշվիչների արկղերի փողադրման նպատակով՝ 683.7 մլն դրամ,
- 0.4 և 6(10) կՎ լարման ցանցերում ցանցերում էլեկտրական էներգիայի ավտոմատ հաշվառման համակարգի համալրման նպատակով՝ 352.5 մլն դրամ, որից ավարտվել են 278.7 մլն դրամի աշխատանքները:

Ամփոփելով հաշվառման համակարգի բարելավմանն ուղղված ներդրումների ծավալի ներկայացումը, նշենք, որ ընկերությունն այդ նպատակով կարարել է ավելի մեծ ծավալի ներդրումներ, քան նախատեսված էր ներդրումային ծրագրով. փաստացի կարարված ներդրումների ծավալը կազմել է ծրագրայինի 127.4%-ը: Նաշվառման համակարգի բարելավման ուղղությամբ իրականացված ներդրումների ծավալում առկա են ծրագրայինը գերազանցող չհիմնավորված ներդրումներ, որոնք ենթակա են նվազեցման սակագնային մարժայով փոխհատուցվող ներդրումների ծավալից, մասնավորապես.

- եռաֆազ իդուկցիոն հաշվիչների ձեռք բերում՝ 1 մլն դրամ,
- հաշվիչների կապիտալ նորոգում՝ 102.5 մլն դրամ:

Բաշխիչ ցանցերի ընդլայնման ուղղությամբ կարարված ներդրումները

Բաշխիչ ցանցերի ընդլայնման ուղղությամբ ներդրումային ծրագրով նախատեսվում էր 200 մլն դրամի ներդրումներ իրականացնել Ծաղկաձոր քաղաքի ցանցի ընդլայնման, Երևան քաղաքի Դուրյան թաղամասի հարակից փարածքի էլեկտրամաքակարարման և այլ անձանց պարկանող ցանցերի ձեռք բերման ուղղությամբ: 2007 թվականի ընթացքում փաստացի ներդրվել է 237,9 մլն դրամ, որից

Ծաղկաձոր քաղաքի ցանցի ընդլայնման ուղղությամբ 60,4 մլն դրամ արժեքով աշխատանքները հանձնվել են շահագործման: մնացած 177.5 մլն դրամի աշխատանքները, որոնք իրականացվել են Դուրյան թաղամասի հարակից փարածքի էլեկտրամատակարարման ուղղությամբ դեռևս անավարտ են:

Անվտանգության տեխնիկայի ապահովման և մաշված սարքավորումների փոխարինման ուղղությամբ կատարված ներդրումներ

Ներդրումների մյուս խոշոր ուղղությունը անվտանգության տեխնիկայի ապահովման և մաշված սարքավորումների փոխարինման ուղղությունն է: Այս ուղղությամբ նախատեսվում էր ներդնել 950.9 մլն դրամ՝ ընդհանուրի 8.7%-ը: Փաստացի ներդրվել է 1004.6 մլն դրամ, որի արդյունքում 938.5 (22.4 մլն դրամի աշխատանքները նախորդ ժամանակաշրջանում իրականացված աշխատանքներն են) մլն դրամի աշխատանքներ հանձնվել են շահագործման: Արդյունքում լարման փարբեր մակարդակներում փոխարինվել են ուժային սրահաֆորմատորներ և այլ շահագործման համար ոչ պիտանի սարքավորումներ, վերակառուցվել են օդային գծեր: Այս ուղղությամբ ծրագրայինի նկատմամբ գերազանցումների ծավալը կազմել է 99.1 մլն դրամ, որը ընկերությունը հիմնավորել է ԷՄՕԿ-ի պահանջներին ենթակայանների բավարարման համար լրացուցիչ ներդրումների իրականացման անհրաժեշտությամբ, որը առաջարկում ենք հաշվի առնել սակագնային մարժայով փոխհատուցված ենթակա ներդրումների ծավալում:

Բաժանորդների հետ կապի կենտրոնի ստեղծմանն ուղղված ներդրումներ

Բաժանորդների հետ կապի կենտրոնի ստեղծման ուղղությամբ նախատեսվում էր ներդնել 60 մլն դրամ՝ համակարգիչների, ծրագրերի, կահույքի և բջջային հեռախոսների ձեռքբերման համար: 2007 թվականի ընթացքում փաստացի ներդրվել է 36 մլն դրամ, որի արդյունքում ձեռք են բերվել 1992 բջջային հեռախոսներ:

Այլ ուղղություններով կատարված ներդրումները

Ներդրումային ծրագրի մնացած ուղղություններով նախատեսվում էր.

- վարչական շենքերի վերակառուցման նպատակով ներդնել 400 մլն դրամ: Փաստացի ներդրվել է 651.6 մլն դրամ և շահագործման են հանձնվել 583.5

մլն դրամի աշխատանքներ (նշված ծավալում 150.1 մլն դրամի աշխատանքները իրականացվել են նախորդ ժամանակաշրջանում), ևս 68 մլն դրամի աշխատանքներ մնացել են անավարտ:

- համակարգչային տեխնիկայի և արտեսուարների ձեռքբերում՝ 134.7 մլն դրամ արժեքով: Փաստացի ձեռք է բերվել 68.7 մլն դրամի համակարգչային տեխնիկա և արտեսուարներ: Այս ուղղությամբ ներդրումները կատարվել են 51.0%-ով:
- գրասենյակային գույքի և կահույքի ձեռքբերման նպատակով փաստացի իրականացված ներդրումները կազմում են 71.3 մլն դրամ կամ նախատեսվածի 142.7%-ը:
- մեքենա-մեխանիզմների ձեռքբերման ուղղությամբ նախատեսված էր ներդնել 275.8 մլն դրամ: Այս ուղղությամբ ներդրվել է 308.3 մլն դրամ՝ նախատեսվածի 111.8%-ը:
- ներդրումային ծրագրով 2007 թվականին նախատեսվում էր հաշվապահական հաշվառման և կառավարման նոր ծրագրային փաթեթի ձեռք բերում՝ 140 մլն դրամ արժեքով: Այս ուղղությամբ փաստացի ներդրվել է 197.7 մլն դրամ (նշված գումարում ներկայացվել է նաև Microsoft ծրագրային փաթեթների լիցենզիաների ձեռք բերման ծախսերը՝ 20.06 մլն դրամ):
- այլ սարքավորումների ձեռք բերման ուղղությամբ ներդրվել է 104.6 մլն դրամ՝ նախատեսվածի 207.2%-ը:

Այս ուղղություններով ծրագրայինի նկատմամբ չհիմնավորված գերազանցումները կազմել են՝ 425.7 մլն դրամ, որոնք նույնպես ենթակա են նվազեցման սակագնային մարժայով փոխհատուցման ենթակա ներդրումների ծավալից:

Սակագնային մարժայով փոխհատուցման ենթակա ներդրումների ծավալը

Ինչպես արդեն նշվեց 2007 թվականի ընթացքում ընկերության կողմից իրականացվել է 13432.3 մլն դրամի ներդրումներ: Ավարտվել են 11993.9 մլն դրամ ընդհանուր արժեքով աշխատանքներ, այդ թվում 925.5 մլն դրամի նախորդ ժամանակաշրջանում իրականացված ներդրումներ: 1438.0 մլն դրամի աշխատանքներ մնացել են անավարտ: Այս աշխատանքները ենթակա են նվազեցման ներդրումների ընդհանուր ծավալից, քանի որ այդ աշխատանքների արդյունքները դեռևս չեն

օգտագործվում լիցենզավորված գործունեության ընթացքում: Փաստացի իրականացված, ավարտված ներդրումների ծավալները ըստ ուղղությունների ներկայացված են աղյուսակում 5-ում:

ԱՂՅՈՒՄԱԿ 5

1	2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՅՐԱԾ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ	13 432.3	
2	Ավարտված ներդրումներ	11 994.2	
2.1	Նանձնաժողովի աշխատակազմի կողմից չընդունված ներդրումների ծավալը, այդ թվում՝	782.3	ենթակա չէ փոխհատուցման սակագնով
2.1.1	արտաքին լուսավորության աշխատանքներ	68.6	
2.1.2	սպառողների հաղորդալարերի և պայայանների փոխարինում	21.1	
2.1.3	արկղերի ձեռքբերման ուղղությամբ չհիմնավորված ներդրումներ	288.6	
2.1.4	անհատույց ստացված հիմնական միջոցներ	57.1	
2.1.5	անհասցե աշխատանքներ	17.1	
2.1.6	ներդրումային ծրագրով չնախատեսված ներդրումներ	74.2	
	հրապապ ներդրումներ	76.7	
2.1.7	մինչև 25000 դրամ ծավալով ներդրումներ	7.8	
2.1.8	ասֆալտապատման աշխատանքներ (չհիմնավորված)	171.1	
2.2	Նախատեսված ներդրումների ծավալները գերազանցող չհիմնավորված ներդրումների ծավալը	977.1	ենթակա չէ փոխհատուցման սակագնով
2.2.1	սպասարկման որակի ցուցանիշների բարելավման ուղղությամբ նախատեսվող ներդրումների ծավալը գերազանցող ներդրումներ	672.8	
2.2.2	եռաֆազ ինդուկցիոն հաշվիչների ձեռքբերում	1.0	
2.2.3	հաշվիչների կապիտալ նորոգում	102.5	
2.2.4	գրասենյակային կահույքի ձեռքբերում	21.3	
2.2.5	մեքենա-մեխանիզմների ձեռքբերում	35.3	
2.2.6	հաշվապահական հաշվառման և կառավարման նոր ծրագրային փաթեթի ձեռքբերում	37.7	
2.2.7	շենքերի և շինությունների վերակառուցում	50.3	
2.2.8	այլ սարքավորումների ձեռքբերում	56.2	
3	2007 թվականի ընթացքում իրականացրած ներդրումներից սակագնային մարժայով փոխհատուցման ենթակա ծավալը	10 234.8	ենթակա է փոխհատուցման սակագնով
